




死亡災害発生情報

- 1 発 生 年 月 日 令和2年4月18日(土曜)午後1時15分
- 2 発 生 場 所 柏崎市
- 3 事業場の業種 土木工事業
- 4 現場労働者数 15名(総員)
- 5 元請・下請の別 下請
- 6 発 注 者 民間
- 7 災害の種類 溺死
- 8 死 傷 者 死亡1名 男性 年令55歳 職種 建設機械運転者 経験年数 26年
- 9 発 生 状 況

令和2年建設業死亡災害件数	
4月18日現在	2名
令和元年 同日現在	1名

事故直前、廃棄物最終処分場造成現場において、降雨により沈砂池（土砂混じりの水を一旦溜め、泥等を沈殿させる池（縦横6m×15m、深さ1.8m））の水位が上昇し、越水の危険性が認められたため重機オペレーター二人が、泥が流出しないように排出管上部に被せてあったネット（吸出防止材）を取り外し、流れを良くすることとした。一人が重機を取りに行ったが、その間に一人が行方不明となり、その後沈砂池底部に設置された排出管（ポリエチレン管直径38cm）に、両足から胸付近まで吸い込まれた状態で被災者が発見された。

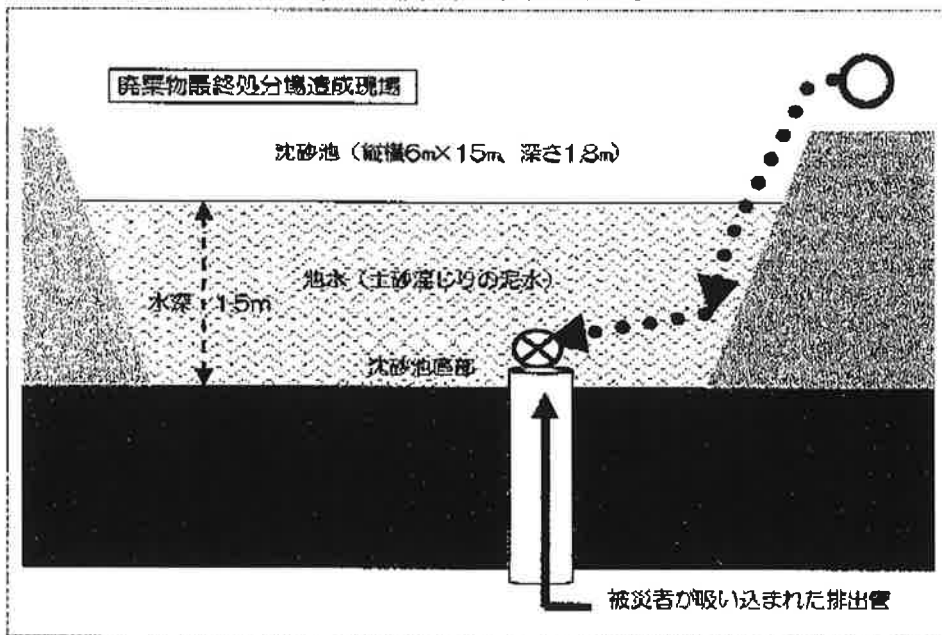

10 コメント

緊急時においても安全に作業を行うため責任者への連絡と指示を受け、作業に当たる必要があります。また、作業開始前に具体的な作業手順を定め、その手順に従い作業を進めることとし、原則、単独作業は行わないこととします。

「STOP! 熱中症 クールワークキャンペーン」がスタートしました。

熱中症による死亡災害ゼロを目指し、熱中症予防対策の徹底を図ることを目的として本キャンペーンが展開されます。

【キャンペーン期間：5月1日～9月30日】



